

Nyhetsbrev December 2020

Ny- samt ombyggnation av Sjukhuset i Sala

Vad händer just nu?

Ombyggnad hus 01 och 02

Rivningsarbeten och samtliga innerväggar är klara.

Plan 12 i hus 01 är målat, mattor lagda, undertak och innerdörrar är monterade. Montage av sakvaror samt komplettering installationer pågår.

Plan 11 i hus 01 är målat och golvläggning, undertak, skåpsnickerier samt installationsarbeten pågår.

Plan 11 i hus 02 är målat och installationsarbeten pågår.

Plan 10 i hus 01 är nästan färdigmålat och installationsarbeten pågår

På plan 09 är samtliga väggar klara, målning och installationsarbeten pågår.

Ny fasad på fläktrum hus 01 är monterat och vi håller på med den nya hissen i huvudentrén samt en ny hisshall på taket till mellandelen mellan hus 01 och 02.

Nybyggnad hus 03-05

Montage av stommen till hus 04 pågår och beräknas vara klart under februari. Golv i hus 03 är gjutet och markarbeten för vinterträdgårdarna utföres nu då det inte går när hus 03 är byggt.

Murningen beräknas starta 1/3-21

Finplanering av mark påbörjas våren 2021 och startar runt hus 01 och 02.


Sala kommun kommer utföra ny beläggning på Heberlegatan under hösten 2021 samt på Lasarettsgatan våren 22.

Produktionen följer tidplanen och arbetena går bra

Vill du veta mer?

Kontakta Regionfastigheter 021-17 35 00, knappval 6


Glöm inte att kika in till webbkameran på kamera.byggdialog.se

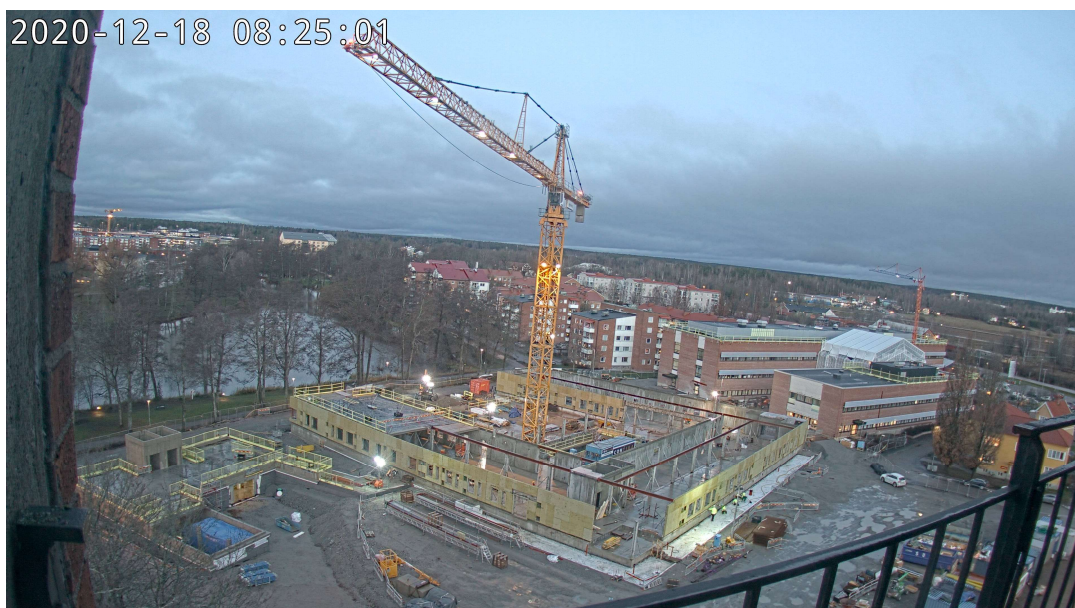

Nyhetsbrev December 2020

Illustration över sjukhusområdet med byggnadernas benämning samt förtydligande över våningarnas benämning.

Källaren:	Plan 09
Markplan:	Plan 10
Våning 1:	Plan 11
Våning 2:	Plan 12

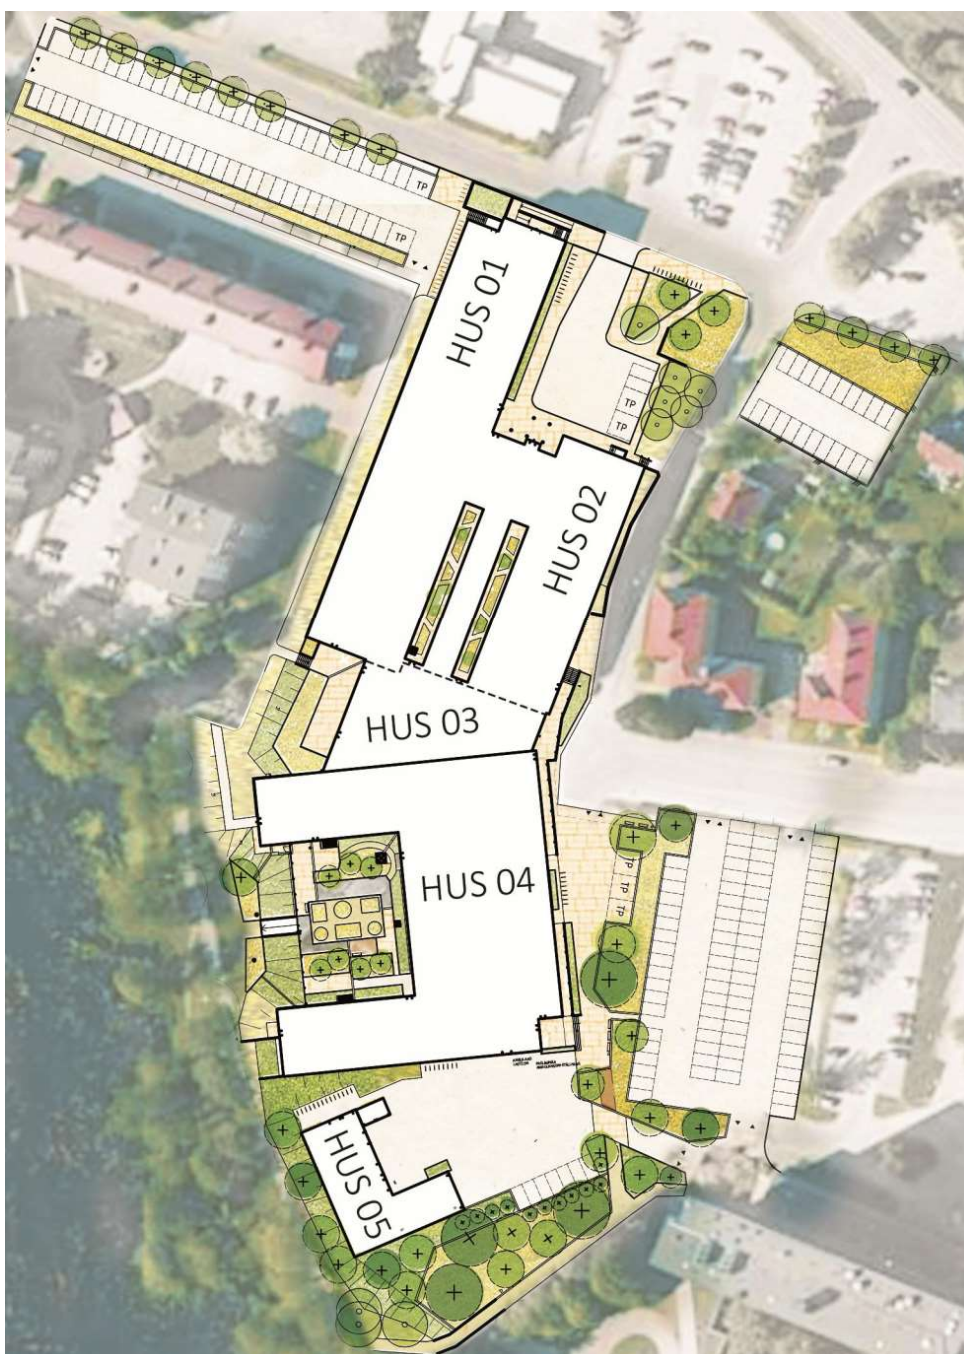




Hus 01, Plan 12




Hus 01, Plan 12



Hus 01, Plan 11

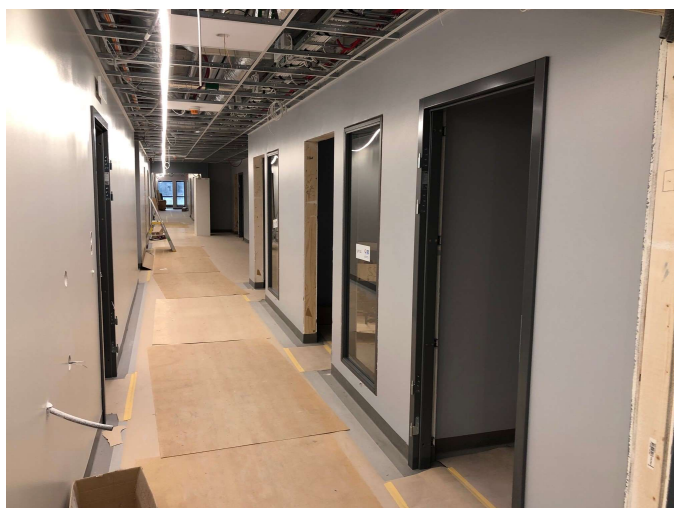

Hus 01, Plan 10

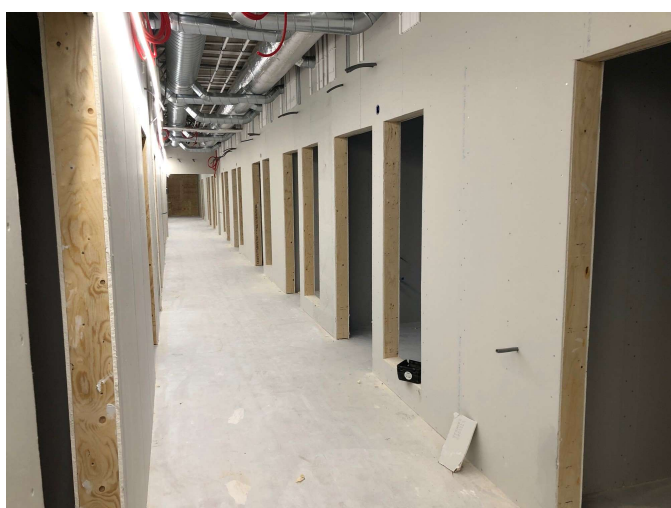

Hus 01, Plan 09



Hus 01, Plan 09

