

Nyhetsbrev Januari 2020


Ny- samt ombyggnation av Sjukhuset i Sala

Vad händer just nu?

Efter en skön och lång ledighet är vi nu igång igen. Vi har redan hunnit färdigställa evakueringslokalerna så barnmottagningen, vårdcentralen, MVC och BVC är inflyttade. Nu är vi alltså redo att sätta igång med invändig rivning i hus 01 (se bild). Den invändiga rivningen kommer hålla på till sommaresemestern.

Innan julen blev omläggningen av VA-ledningarna runt hus 01 och 02 klart (se bild). Vi hann också klart med den nya gång- och cykelbanan. Nu är det bara lite grässådd som väntar i vår.

Inne på byggarbetsplatsen är vi klara med schaktning och sanering och har börjat med pålning. Pålarna hjälper till att föra ner laster från huset ner till fast mark. Vi kommer enbart ner till berg i ett hörn av nybyggnationen, men med hjälp av friktionsålar kommer salabornas nya sjukhus stå på en stabil grund.

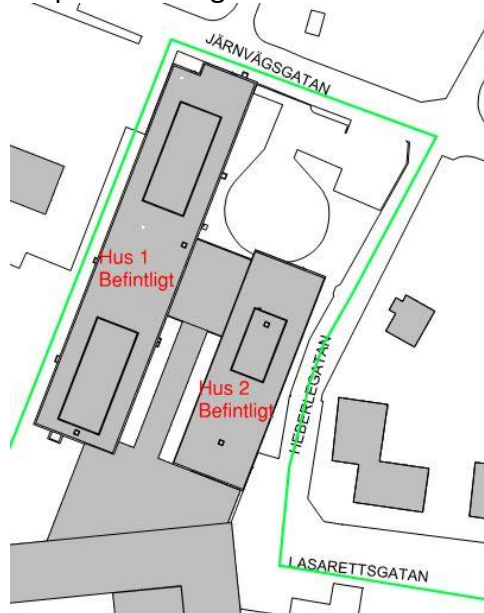

Omdragning av VA-ledningar markerat i grönt

Vad är det som ska göras?

- Slå ner ca. 600 pålar. Arbetet kommer pågå i ungefär 7 veckor.
- Därefter kommer vi platsgjuta bland annat kulvert och 4 st. skyddsrum. Resten av huset kommer bli prefabricerat och lyftas på plats. Arbetet inleds våren 2020.
- Vi ska mura alla de nyproducerade byggnaderna. Teglet är i samma färg som befintliga byggnader.
- Vi ska bland annat montera 294 st handfat och dra över 5 km rör till dessa.
- 675 två- och spritdispensrar ska monteras. Det kommer ta ungefär 338 timmar.
- I de nya byggnaderna ska ungefär 3,5 km ventilationskanaler dras. Genom dessa kommer 16 000 liter luft flöda varje sekund.

Vill du veta mer?

Kontakta Regionfastigheter 021-17 35 00, knappval 6

Glöm inte att kika in till webkameran på kamera.byggdialog.se

God fortsättning
önskar ByggDialog
och
Regionfastigheter
